

Diagrama de Gantt — PPS StudIA

Proyecto: StudIA — Asistente de estudio sobre corpus académico


Autor: De Palma, Marcos Agustin · **Docente / Tutor:** Cristian Lukaszewicz

Período: junio – septiembre de 2026 · **Entrega:** 18/09/2026

Carrera: Ingeniería Mecatrónica (FI-UNLZ)

Este Gantt no es una estimación hecha a posteriori. Las etapas 3 a 5 se derivan del historial de commits del repositorio de código ([UNLZ_Llamacode_StudIA](#), rama `feature/studia`) y de los registros del repositorio local: cada tarea termina en un commit verificable, con su fecha y su hash. Las etapas 1 y 2 son anteriores al primer commit y están marcadas como **estimadas**.


1. Gantt general de la PPS

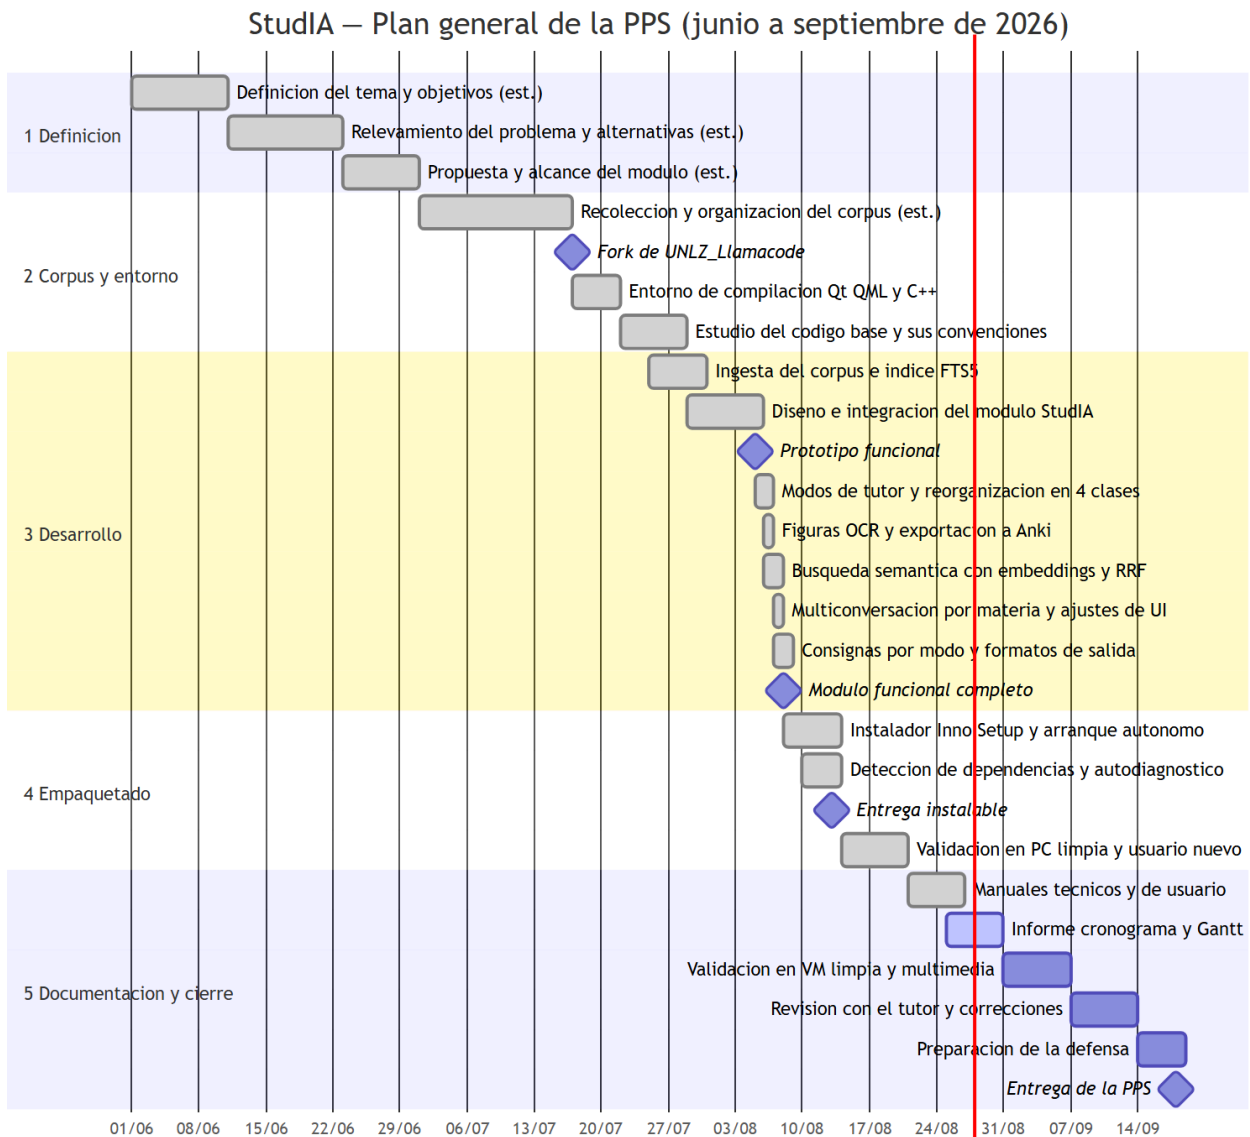

2. Gantt de detalle — desarrollo del módulo (5 al 13 de agosto)

Las barras corresponden a la **ventana entre commits**, con la fecha y hora reales registradas en el repositorio. No representan horas continuas de trabajo, sino el tramo de calendario en el que se produjo cada entrega parcial.

Studia – Desarrollo del modulo, commit a commit

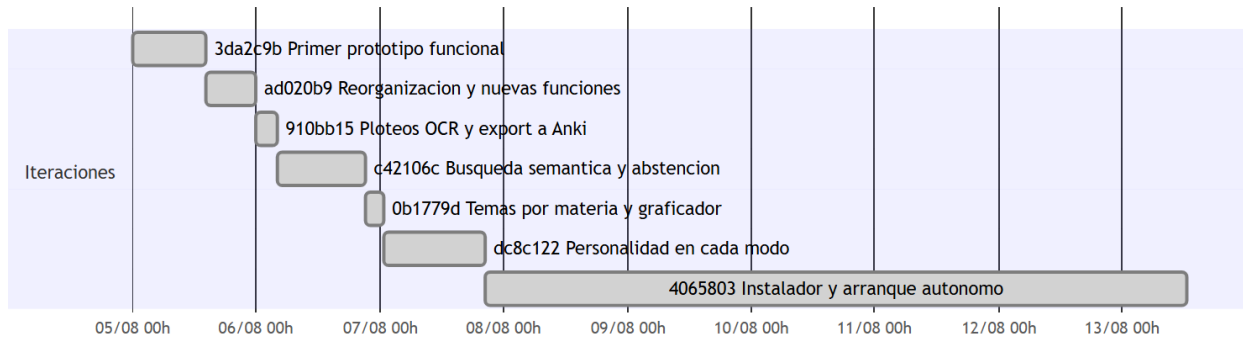

3. Tabla de respaldo del Gantt

#	Etapas / tarea	Inicio	Fin	Evidencia
1.1	Definición del tema y objetivos	01/06/2026	10/06/2026	estimada
1.2	Relevamiento del problema y alternativas	11/06/2026	22/06/2026	estimada
1.3	Propuesta y alcance del módulo	23/06/2026	30/06/2026	estimada
2.1	Recolección y organización del corpus académico	01/07/2026	16/07/2026	estimada · corpus DATA (23 GB)
2.2	Fork de cristianlukas/UNLZ_Llamacode	17/07/2026	—	registro de clonado del repositorio
2.3	Entorno de compilación (Qt/QML + C++/CMake)	17/07/2026	21/07/2026	estimada sobre fechas de archivos
2.4	Estudio del código base y sus convenciones	22/07/2026	28/07/2026	estimada
3.1	Ingesta del corpus e índice FTS5	25/07/2026	30/07/2026	tools/studia/ingest.py
3.2	Diseño e integración del módulo	29/07/2026	05/08/2026	commit 3da2c9b
3.3	Primer prototipo funcional	05/08/2026	—	commit 3da2c9b (18 arch., +3.312 líneas)
3.4	Modos de tutor y reorganización en 4 clases	05/08/2026	06/08/2026	commit ad020b9 (21 arch., +3.375)
3.5	Figuras, OCR y exportación a Anki	06/08/2026	06/08/2026	commit 910bb15 (25 arch., +2.778)
3.6	Búsqueda semántica (embeddings + RRF)	06/08/2026	06/08/2026	commit c42106c (16 arch., +1.174)
3.7	Multiconversación por materia y ajustes de UI	06/08/2026	07/08/2026	commit 0b1779d (14 arch., +1.573)
3.8	Consignas por modo y formatos de salida	07/08/2026	07/08/2026	commit dc8c122 (10 arch., +1.624)

#	Etapas / tarea	Inicio	Fin	Evidencia
4.1	Instalador y arranque autónomo del servidor	08/08/2026	13/08/2026	commit 4065803 (26 arch., +1.796)
4.2	Detección de dependencias y autodiagnóstico	10/08/2026	13/08/2026	StudiaHerramientas , instalar_dependencias.ps1
4.3	Entrega instalable	13/08/2026	—	commit 4065803
4.4	Validación en PC limpia y usuario nuevo	14/08/2026	20/08/2026	installer/PROBAR_EN_PC_LIMPIA.md
5.1	Manuales técnicos y de usuario	21/08/2026	26/08/2026	INFORMES/manuales/
5.2	Informe, cronograma, Gantt y diagramas	25/08/2026	30/08/2026	este repositorio
5.3	Validación en VM limpia, capturas y video	31/08/2026	06/09/2026	planificada
5.4	Revisión con el tutor y correcciones	07/09/2026	13/09/2026	planificada
5.5	Preparación de la defensa	14/09/2026	18/09/2026	planificada
5.6	Entrega de la PPS	18/09/2026	—	—

4. Cómo regenerar la imagen

El Gantt está escrito en [Mermaid](#): GitHub lo renderiza solo al abrir este archivo. Para obtener el PNG que se inserta en el informe:

```
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli
python INFORMES/build_docs.py          # regenera assets/gantt.png y los PDF
```

La imagen queda en [assets/gantt.png](#) y en [assets/gantt_detalle.png](#).
